ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		**Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovec**	**177 dny**	**1.3. 26**	**31.10. 26**
2		**Zateplenie plochy obvodového plášťa - Oblasť A**		**2.3. 26**	
3		Pripravné práce na zariadení staveniska	7 dny	2.3. 26	10.3. 26
4		Zemné práce	10 dny	11.3. 26	24.3. 26
5		Zakladanie	10 dny	25.3. 26	7.4. 26
6		Konštrukcie zvisle a kompletné	10 dny	8.4. 26	21.4. 26
7		Konštrukcie vodorovné	3 dny	20.7. 26	22.7. 26
8		Komunikácie	4 dny	20.7. 26	23.7. 26
9		Úpravy povrchov, podlahy	60 dny	22.4. 26	14.7. 26
10		Buracie práce	10 dny	25.3. 26	7.4. 26
11		Izolácie proti vode a vlkosti	3 dny	15.7. 26	17.7. 26
12		Konštrukcie klampiarske	5 dny	15.7. 26	21.7. 26
13		Konštrukcie doplnkové kovove	3 dny	22.7. 26	24.7. 26
14		**Zateplenie plochy strešného plášťa - Oblať A**			
15		Izolácie tepelné	5 dny	1.7. 26	7.7. 26
16		Konštrukcie tesárske	30 dny	15.4. 26	26.5. 26
17		Konštrukcie klampiarske	29 dny	6.7. 26	13.8. 26
18		Krytiny tvrdé	3 dny	1.7. 26	3.7. 26
19		Konštrukcie doplnkové kovove	25 dny	27.5. 26	30.6. 26
20		Konštrukcie - drevostavby	20 dny	3.7. 26	30.7. 26
21		Dokončovacie práce - natery	30 dny	15.8. 26	24.9. 26
22		**Výmena vonkajšej otvorovej konštrukcie - Oblať A**			
23		Zvisle a kompletné konštrukcie	5 dny	13.5. 26	19.5. 26
24		Konštrukcie stolárske	25 dny	20.5. 26	23.6. 26
25		Ostatné konštrukcie a práce - búracie	12 dny	27.4. 26	12.5. 26
26		Konštrukcie stolarske	25 dny	20.5. 26	23.6. 26
27		Konštrukcie klampiarske	10 dny	15.7. 26	28.7. 26
28		Konštrukcie kovové	10 dny	24.6. 26	7.7. 26
29		Dokončovacie práce - natery	15 dny	12.10. 26	30.10. 26
30		**Zateplenie konštrukcie podláh - Oblasť A**			
31		Zemné práce	8 dny	15.4. 26	24.4. 26
32		Zakladanie	10 dny	27.4. 26	8.5. 26
33		Komunikácie	12 dny	10.9. 26	25.9. 26
34		Úpravy povrchov, podlahy	10 dny	28.5. 26	10.6. 26
35		Ostatné konštrukcie a práce - búracie	25 dny	11.3. 26	14.4. 26
36		Izolácie proti vode a vlkosti	5 dny	11.5. 26	15.5. 26
37		Podlahy z dlaždic	15 dny	25.6. 26	15.7. 26
38		Izolácie tepelné	8 dny	18.5. 26	27.5. 26
39		Podlahy vlysové a parketové	3 dny	28.5. 26	1.6. 26
40		**Ostatné práce - Obalsť B**			
41		Zemné práce	2 dny	27.4. 26	28.4. 26
42		Zakladanie	5 dny	29.4. 26	5.5. 26
43		Zvislé konštrukcie	12 dny	6.5. 26	21.5. 26
44		Konštrukcie vodorovné	8 dny	3.6. 26	12.6. 26
45		Úpravy povrchov, podlahy	20 dny	8.5. 26	4.6. 26
46		Ostatné konštrukcie a práce - búracie	15 dny	15.4. 26	5.5. 26
47		Izolácie proti vode a vlkosti	1 den	5.6. 26	5.6. 26
48					
49		Konštrukcie drevostavby	20 dny	5.6. 26	2.7. 26
50		Konštrukcie stolárske	5 dny	24.9. 26	30.9. 26
51		Konštrukcie doplnkové kovove	3 dny	27.7. 26	29.7. 26
52		Podlahy z dlaždic	10 dny	30.7. 26	12.8. 26
53		Podlahy vlysové a parketové	20 dny	15.8. 26	10.9. 26
54		Obklady	12 dny	5.8. 26	20.8. 26
55		Maľby	25 dny	20.9. 26	22.10. 26
56		Zasklievanie	3 dny	24.6. 26	26.6. 26
57		**Búrace práce - Oblasť B**			
58		Ostatné konštrukcie a práce - búracie	2 dny	8.4. 26	9.4. 26
59		Podlahy povlakové	20 dny	19.8. 26	15.9. 26
60		**Zdravotechnika - Oblasť A**			
61		Vnútorný vodovod	6 dny	19.8. 26	26.8. 26
62		**Zdravotechnika - Oblasť B**			
63		D1 - ZTI izolácia potrubia	10 dny	19.6. 26	2.7. 26
64		D1 - ZTI rozvody vody a kanalizacie	20 dny	22.5. 26	18.6. 26
65		D1 - ZTI zaradovacie predmety	1 den?	1.3. 26	1.3. 26
66		Zemné práce	5 dny	15.5. 26	21.5. 26
67		Vodorovné konštrukcie	3 dny	22.5. 26	26.5. 26
68		Zdravotechnika vnútorná kanlizácia	5 dny	19.6. 26	25.6. 26
69		**UK - Oblasť A**			
70		Rozvody potrubia	15 dny	11.6. 26	1.7. 26
71		Vykurovacie telesa	20 dny	2.7. 26	29.7. 26
72		Armatury	15 dny	2.7. 26	22.7. 26
73		Kotolne	14 dny	30.7. 26	18.8. 26
74		Strojovne	10 dny	19.8. 26	1.9. 26
75		Izolácie tepelné	6 dny	2.7. 26	9.7. 26
76		**Plynoinštalácia - Oblasť B**			

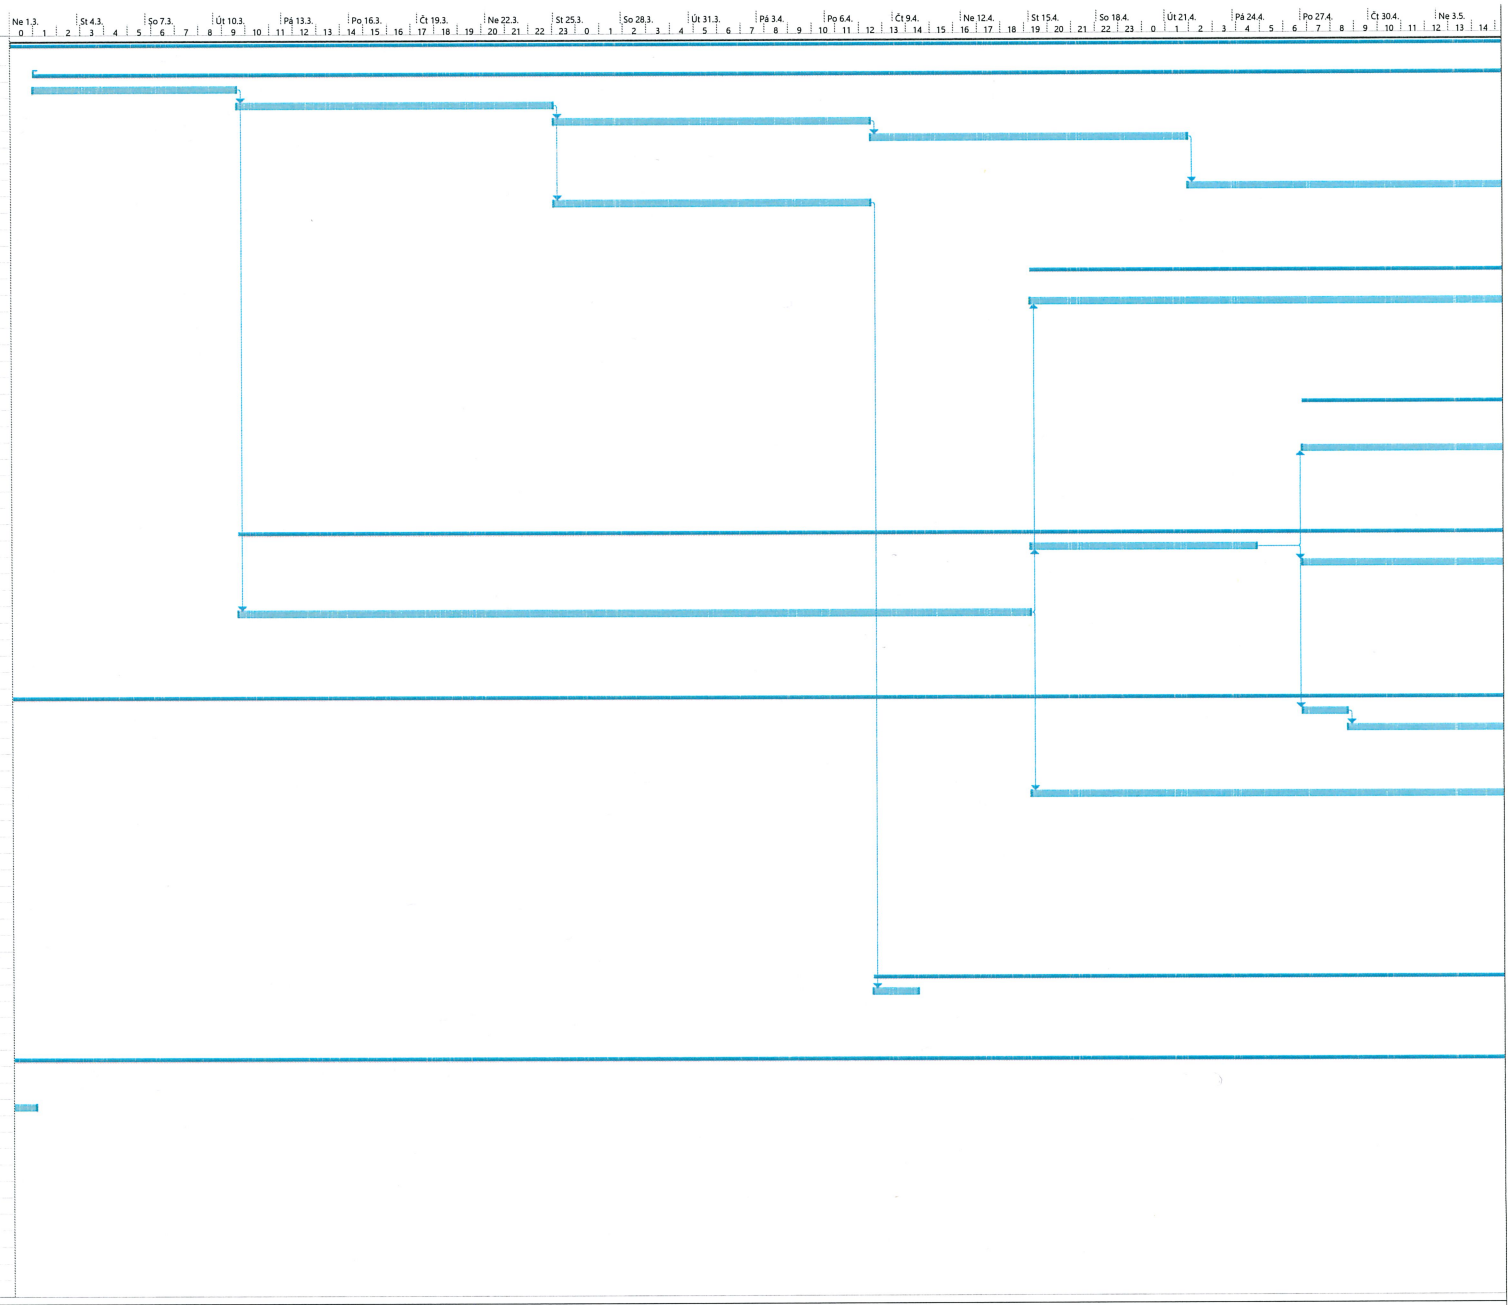

Projekt: Reko.OD Bukovce
Datum: 28.9. 26

Úkol | Souhrnný | Neaktivní milník | Pouze s dobou trvání | Pouze zahájení | Vnější milník | Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení | Souhrn projektu | Neaktivní souhrn | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Pouze s datem dokončení | Konečný termín
Milník | Neaktivní úkol | Ruční úkol | Ruční souhrn | Vnější úkoly | Průběh

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
77		Zemné práce	8 dny	19.8. 26	28.8. 26
78		Vodorovné konštrukcie	2 dny	8.9. 26	9.9. 26
79		Rurové vedenie	1 den	7.9. 26	7.9. 26
80		Ostatné konštrukcie a práce - búracie	1 den	18.8. 26	18.8. 26
81		Zdravotechnika	5 dny	31.8. 26	4.9. 26
82		Montaž potrubia	6 dny	31.8. 26	7.9. 26
83		**Elektroinštalácia B**			
84		Ostatné konštrukcie a práce - búracie	2 dny	22.5. 26	25.5. 26
85		Elektromontaže	10 dny	26.5. 26	8.6. 26
86		Rozvadzače	10 dny	9.6. 26	22.6. 26
87		**Osvetlanie bleskozvod, MaR - Oblasť A**			
88		Elektromontaže	60 dny	22.5. 26	13.8. 26
89		Bleskozvod	5 dny	1.7. 26	7.7. 26
90		Meranie a regulacia	4 dny	19.8. 26	24.8. 26
91		**Vzduchotechnika - Oblasť A**			
92		Ostatné konštrukcie a práce - búracie	8 dny	1.8. 26	11.8. 26
93		Izolácie tepelné	10 dny	31.8. 26	11.9. 26
94		Konštrukcie tesarské	3 dny	12.8. 26	14.8. 26
95		Konštrukcie doplnkové kovove	5 dny	14.9. 26	18.9. 26
96		Montaž vzduchotechnických zariadení	10 dny	25.8. 26	7.9. 26
97		Montaž vzduchotechnických potrubí	10 dny	17.8. 26	28.8. 26
98		Montaž vzduchotechnických komponentov	10 dny	31.8. 26	11.9. 26
99		**Fotovoltické zariadenie - Oblasť A**			
100		Elektromontaže	10 dny	1.7. 26	14.7. 26
101		**Exteriérove žaluzie - Oblasť A**			
102		Elektromontaže montaž U boxov	20 dny	1.7. 26	28.7. 26

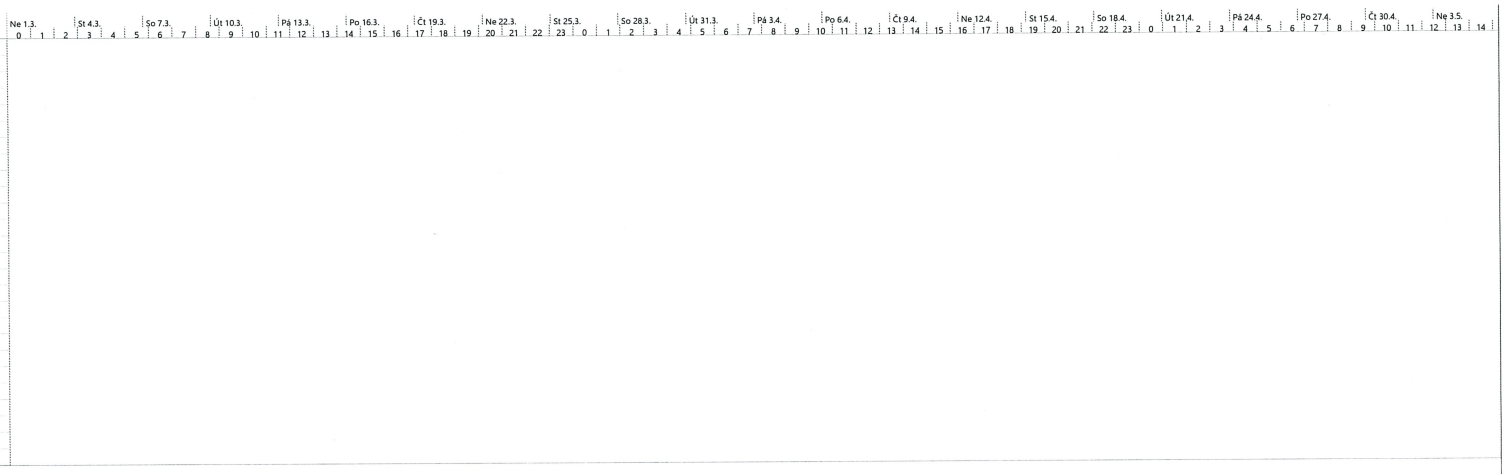

Projekt: Reko.OD Bukovce
Datum: 28.9. 26

Úkol
Souhrnný
Neaktivní milník
Pouze s dobou trvání
Pouze zahájení
Vnější milník
Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení
Souhrn projektu
Neaktivní souhrn
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Pouze s datem dokončení
Konečný termín
Milník
Neaktivní úkol
Ruční úkol
Ruční souhrn
Vnější úkoly
Průběh

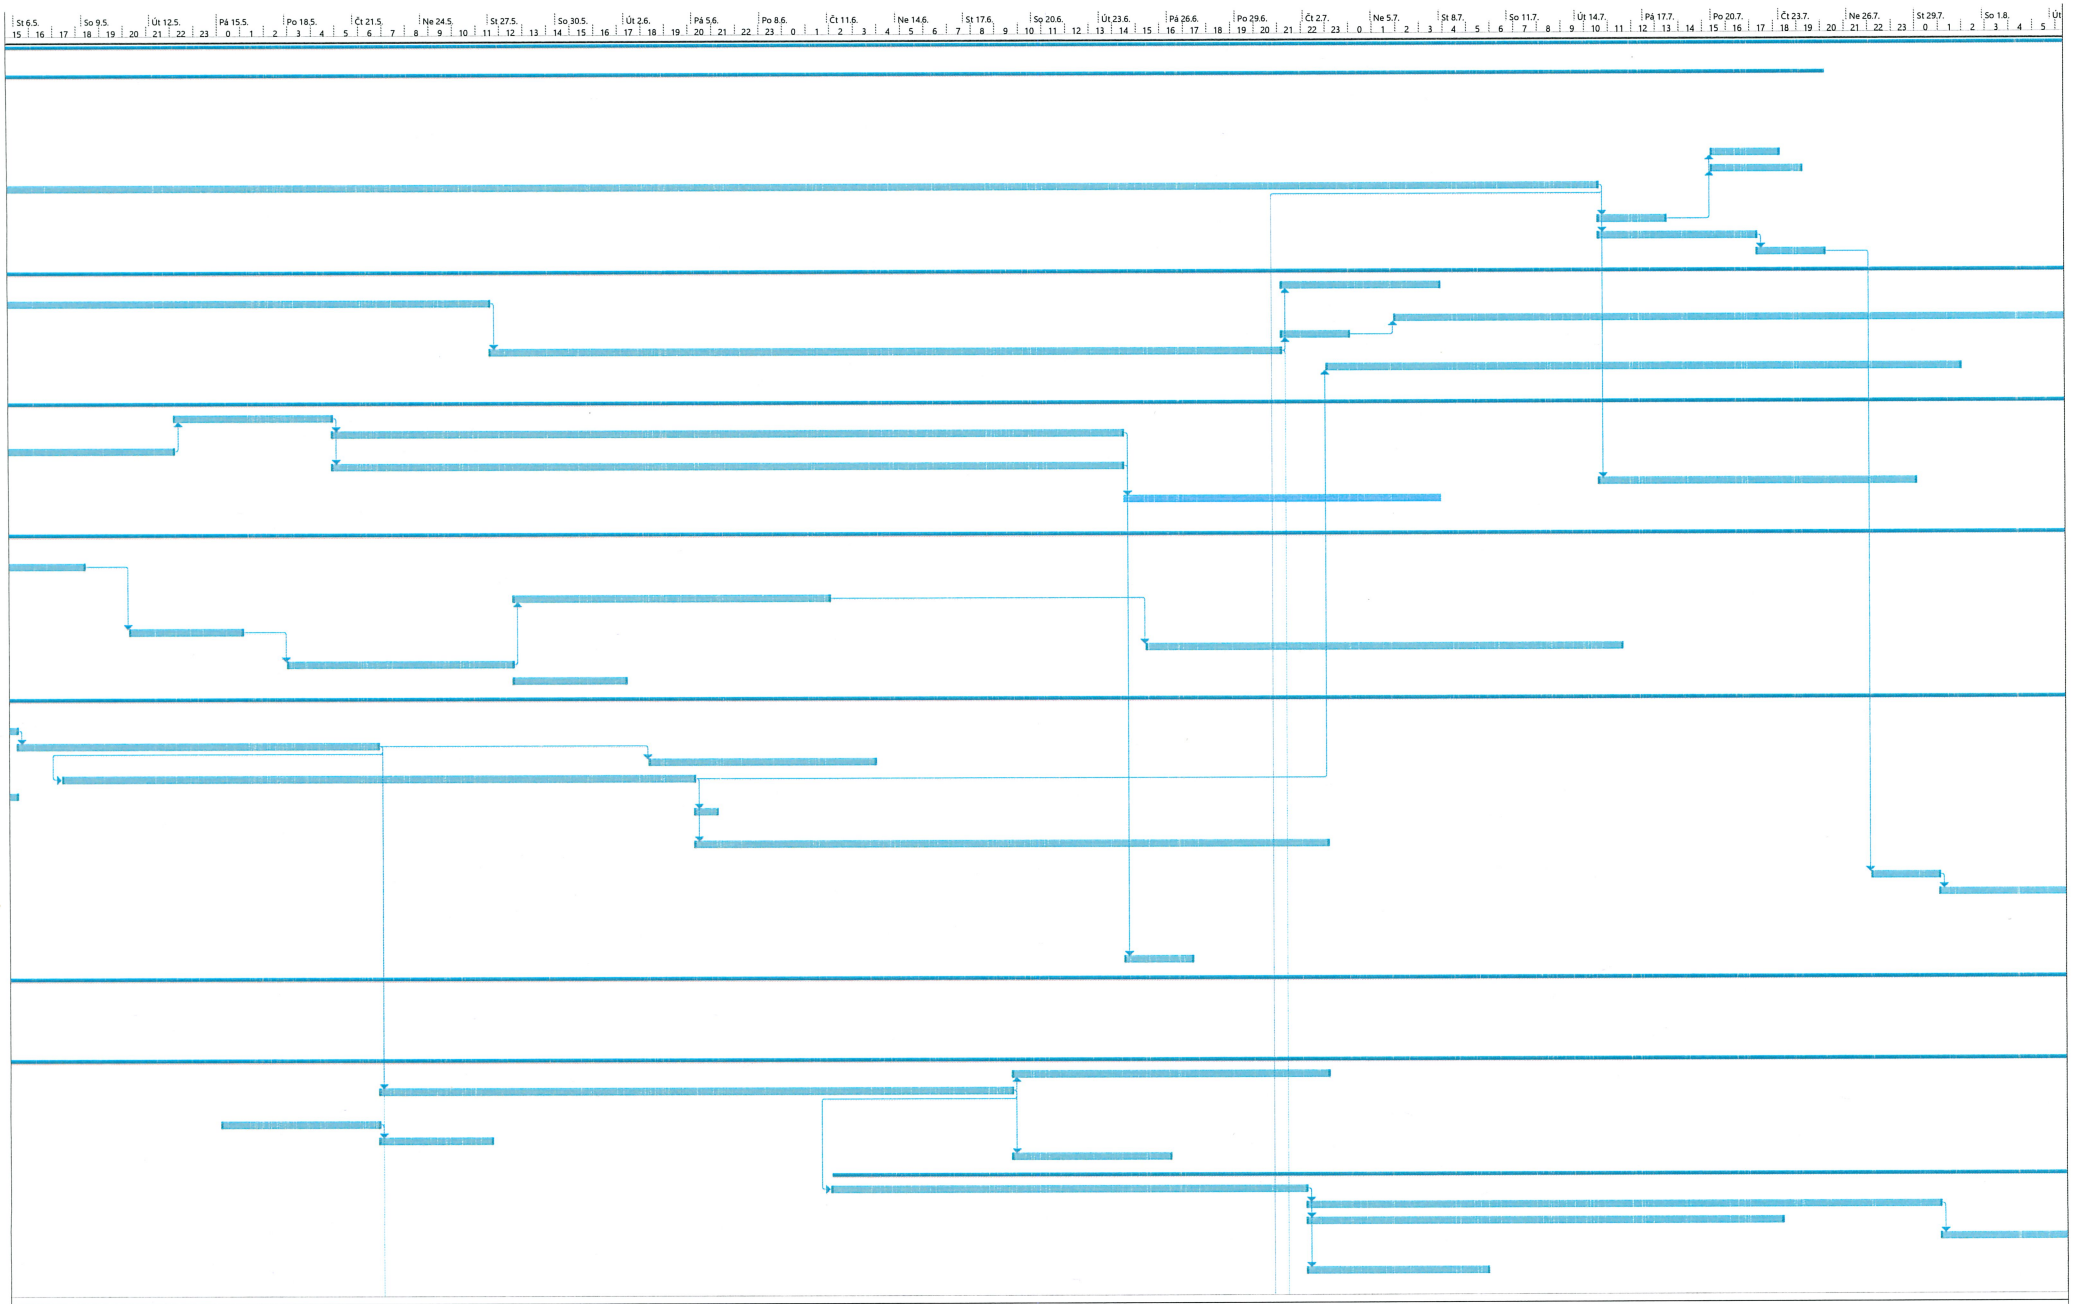

Projekt: Reko.OD Bukovce
Datum: 28.9. 26

Úkol	Souhrnný	Neaktivní milník	Pouze s dobou trvání	Pouze zahájení	Vnější milník	Průběh ručně zadaného úkolu	
Rozdělení	Souhrn projektu	Neaktivní souhrn	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Pouze s datem dokončení	Konečný termín		
Milník	Neaktivní úkol	Ruční úkol	Ruční souhrn	Vnější úkoly	Průběh		

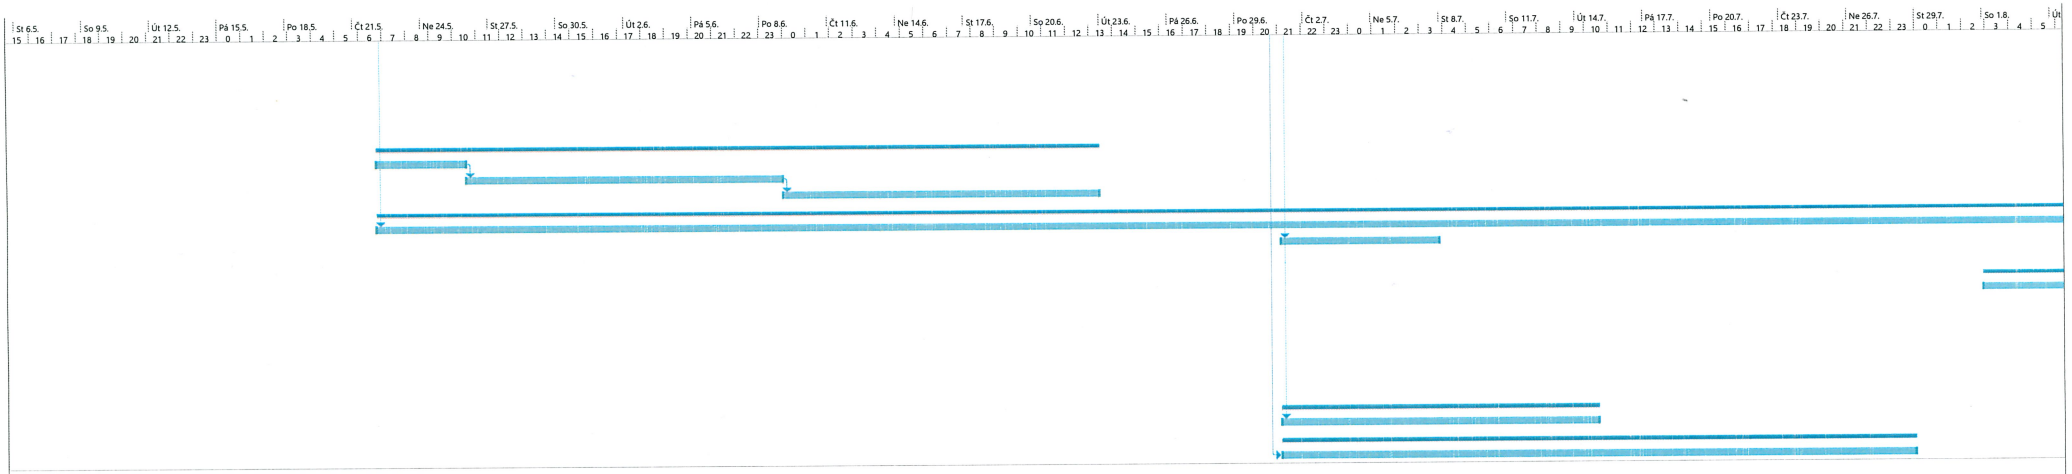

Projekt: Reko.OD Bukovce
Datum: 28.9. 26

Úkol	Souhrnný	Neaktivní milník	Pouze s dobou trvání	Pouze zahájení	Vnější milník	Průběh ručně zadaného úkolu	
Rozdělení	Souhrn projektu	Neaktivní souhrn	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Pouze s datem dokončení	Konečný termín		
Milník	Neaktivní úkol	Ruční úkol	Ruční souhrn	Vnější úkoly	Průběh		

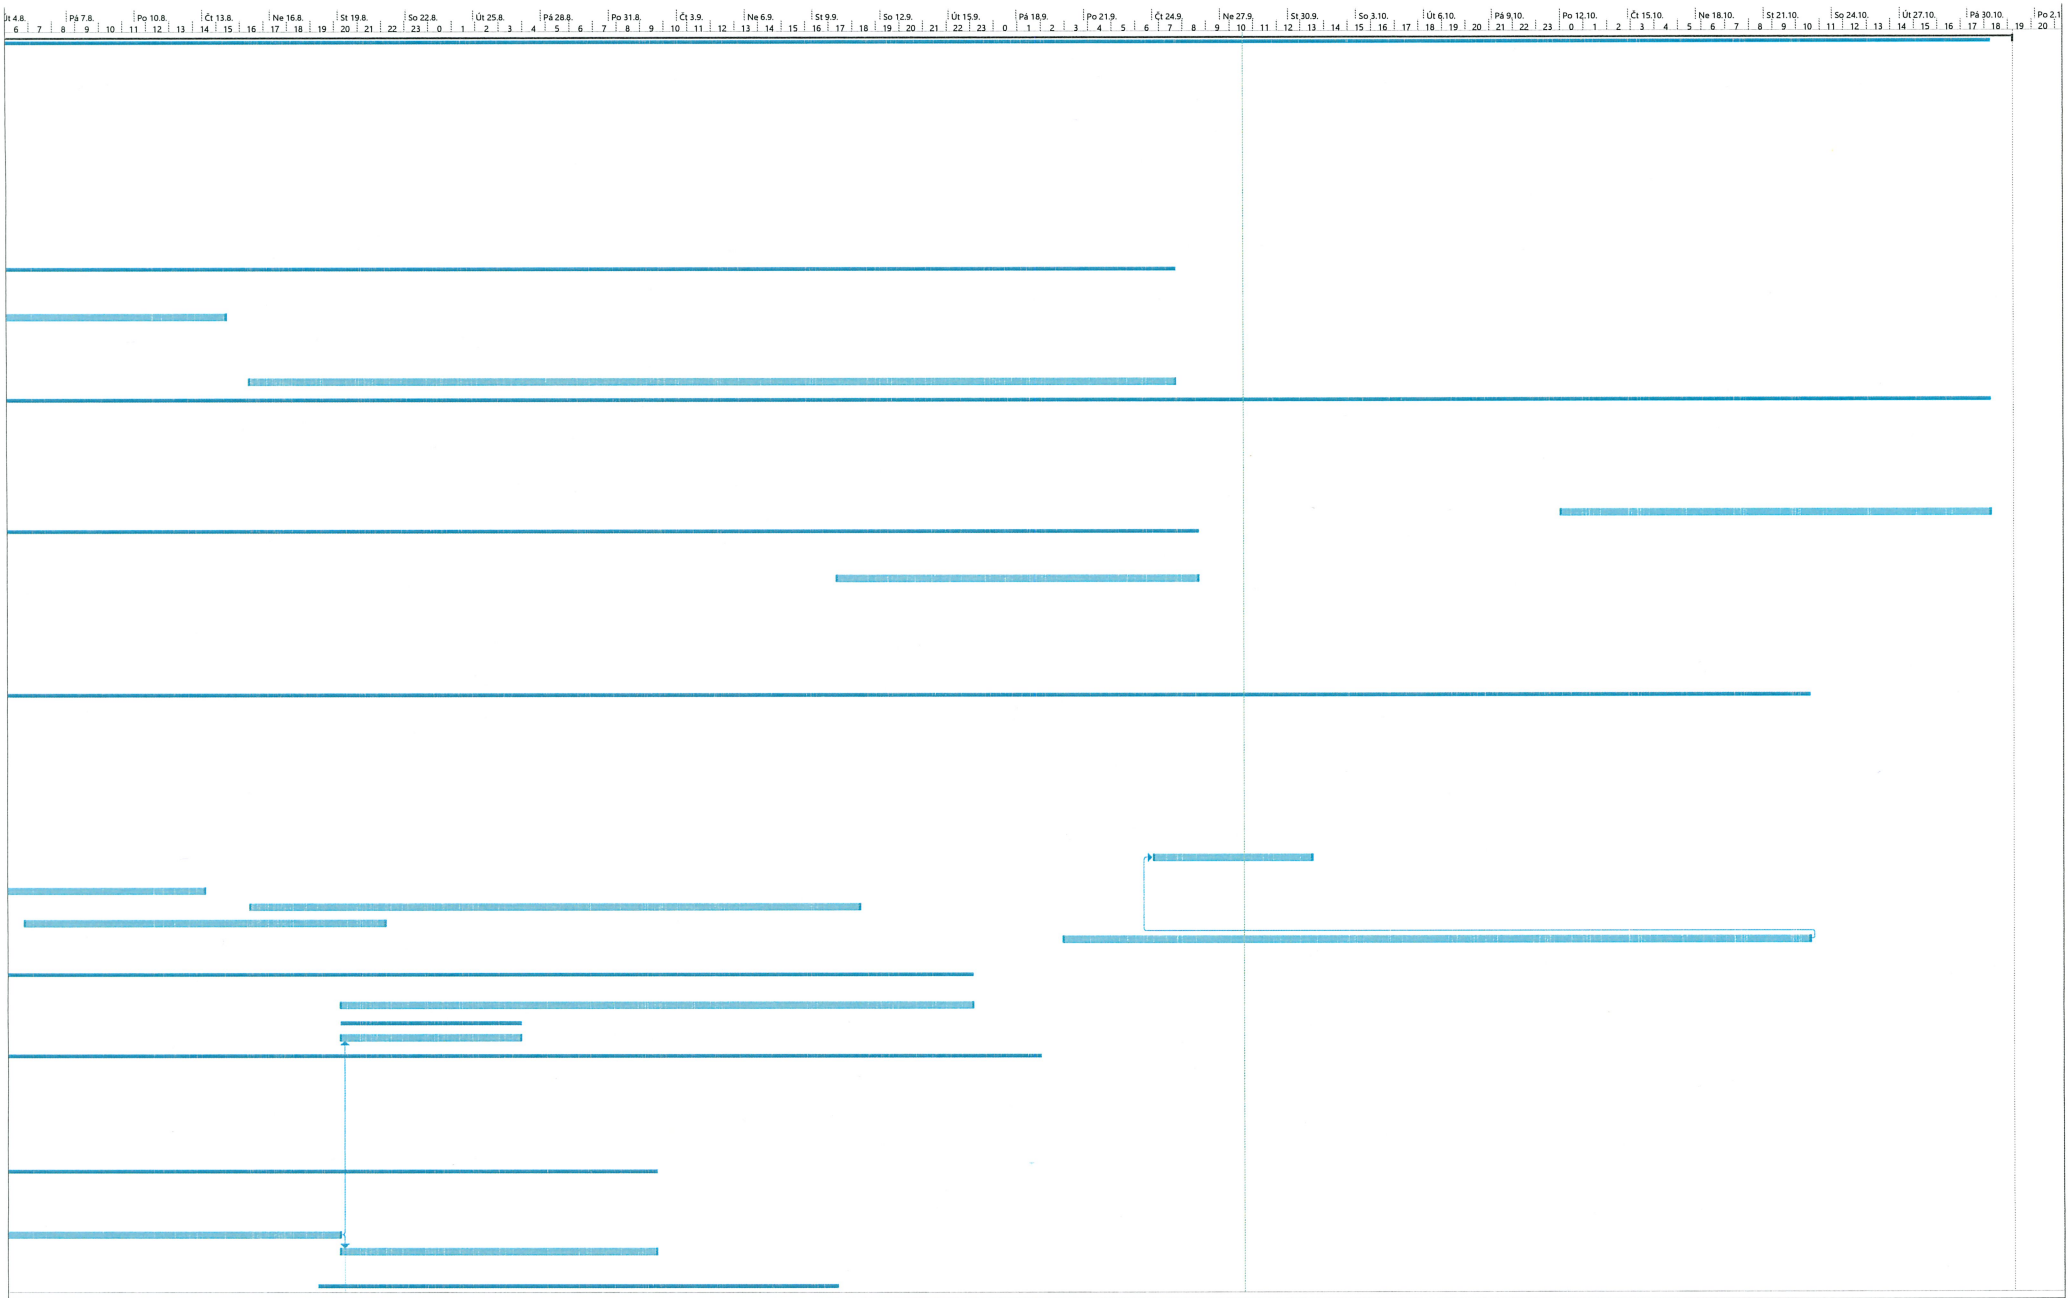

Projekt: Reko.OD Bukovce
Datum: 28.9. 26

Úkol	Souhrnný	Neaktivní milník	Pouze s dobou trvání	Pouze zahájení	Vnější milník	Průběh ručně zadaného úkolu	
Rozdělení	Souhrn projektu	Neaktivní souhrn	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Pouze s datem dokončení	Konečný termín		
Milník	Neaktivní úkol	Ruční úkol	Ruční souhrn	Vnější úkoly	Průběh		

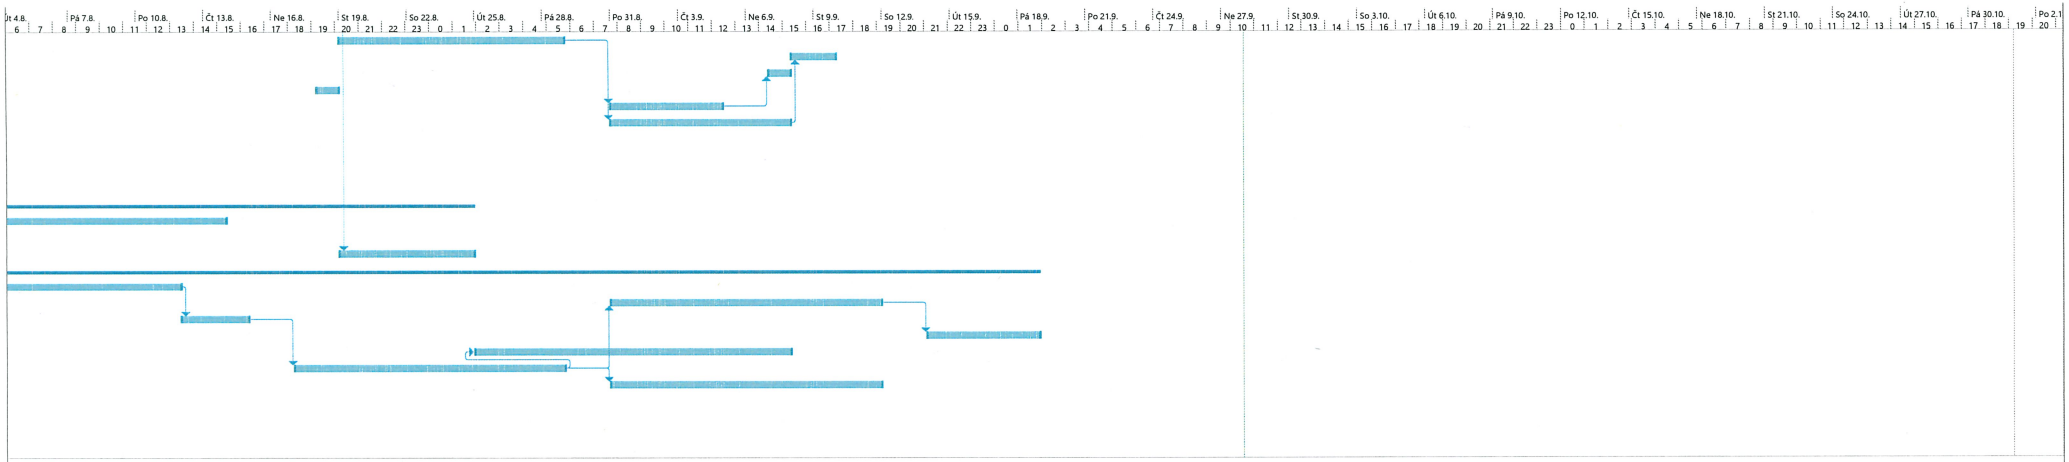

Projekt: Reko.OD Bukovce
Datum: 28.9. 26

Úkol	Souhrnný	Neaktivní milník	Pouze s dobou trvání	Pouze zahájení	Vnější milník	Průběh ručně zadaného úkolu	
Rozdělení	Souhrn projektu	Neaktivní souhrn	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Pouze s datem dokončení	Konečný termín		
Milník	Neaktivní úkol	Ruční úkol	Ruční souhrn	Vnější úkoly	Průběh		
